Atualização em 27 OUT 2024

CRONOGRAMA REPAROS EMERGENCIAIS

ANO		2025			
MÊS		FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	
DIAS ÚTEIS		01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41	42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
0.1 -REUNIÃO PAR INÍCIO DE ATIVIDADES	Planejado				
	Real				
0.2- VISITA AS INSTALAÇÕES	Planejado				
	Real				
0.3- VISTORIAS DOS EQUIPAMENTOS	Planejado				
	Real				
0.4- ASSINATURA DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO	Planejado				
	Real				
0.5- MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ATENDIMENTO DE CHAMADS	Planejado				
	Real				
0.6-ELABORAÇÃO LAUDOS TÉCNICOS	Planejado				
	Real				
0.7-ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS	Planejado				
	Real				
0.8- ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA MACRO DE SERVIÇOS	Planejado				
	Real				
0.9-REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO LAUDOS, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA	Planejado				
	Real				
0.10-APROVAÇÃO DOS ORÇAMENTOS	Planejado				
	Real				
0.11-ASSINATURA DOS CONTRATOS	Planejado				
	Real				
0.12- PAGAMENTO 1ª PARCELA	Planejado				
	Real				
0.13-ENCOMENDA DE PEÇAS E COMPONENTES	Planejado				
	Real				
0.14-RECEBIMENGTO DO MATERIAL NA OBRA	Planejado				
	Real				
1- SERVIÇOS EMERGENCIAIS	Planejado				
	Real				
1.1- TERMINAL AEROPORTO	Planejado				
	Real				
1.2 - TERMINALTANCREDO NEVES	Planejado				
	Real				
1.3 - TERMINAL CAJUEIRO SECO	Planejado				
	Real				
1.4 - TERMINAL LARGO DA PAZ	Planejado				
	Real				
1.5 - TERMINAL RODOVIARIA - TIP	Planejado				
	Real				
2- MANUTENÇÃO CORRETIVA P/ REDUÇÃO PARALIZAÇÕES	Planejado				
	Real				
2.1- TERMINAL AEROPORTO	Planejado				
	Real				
2.2 - TERMINALTANCREDO NEVES	Planejado				
	Real				
2.3 - TERMINAL CAJUEIRO SECO	Planejado				
	Real				
2.4 - TERMINAL LARGO DA PAZ	Planejado				
	Real				
2.5 - TERMINAL RODOVIARIA - TIP	Planejado				
	Real				
3- CORREÇÕES ESTETICAS E ADEQUAÇÃO NORMAS	Planejado				
	Real				
3.1- TERMINAL AEROPORTO	Planejado				
	Real				
3.2 - TERMINALTANCREDO NEVES	Planejado				
	Real				
3.3 - TERMINAL CAJUEIRO SECO	Planejado				
	Real				
3.4 - TERMINAL LARGO DA PAZ	Planejado				
	Real				
3.5 - TERMINAL RODOVIARIA - TIP	Planejado				
	Real				
4- INSPEÇÕES DE QUALIDADES	Planejado				
	Real				
4.1- TERMINAL AEROPORTO	Planejado				
	Real				
4.2 - TERMINALTANCREDO NEVES	Planejado				
	Real				
4.3 - TERMINAL CAJUEIRO SECO	Planejado				
	Real				
4.4 - TERMINAL LARGO DA PAZ	Planejado				
	Real				
4.5 - TERMINAL RODOVIARIA - TIP	Planejado				
	Real				
5-CORREÇÕES DE PENDENCIAS	Planejado				
	Real				
6- REUNIÃO PARA ENTREGA DOS SERVIÇOS	Planejado				
	Real				

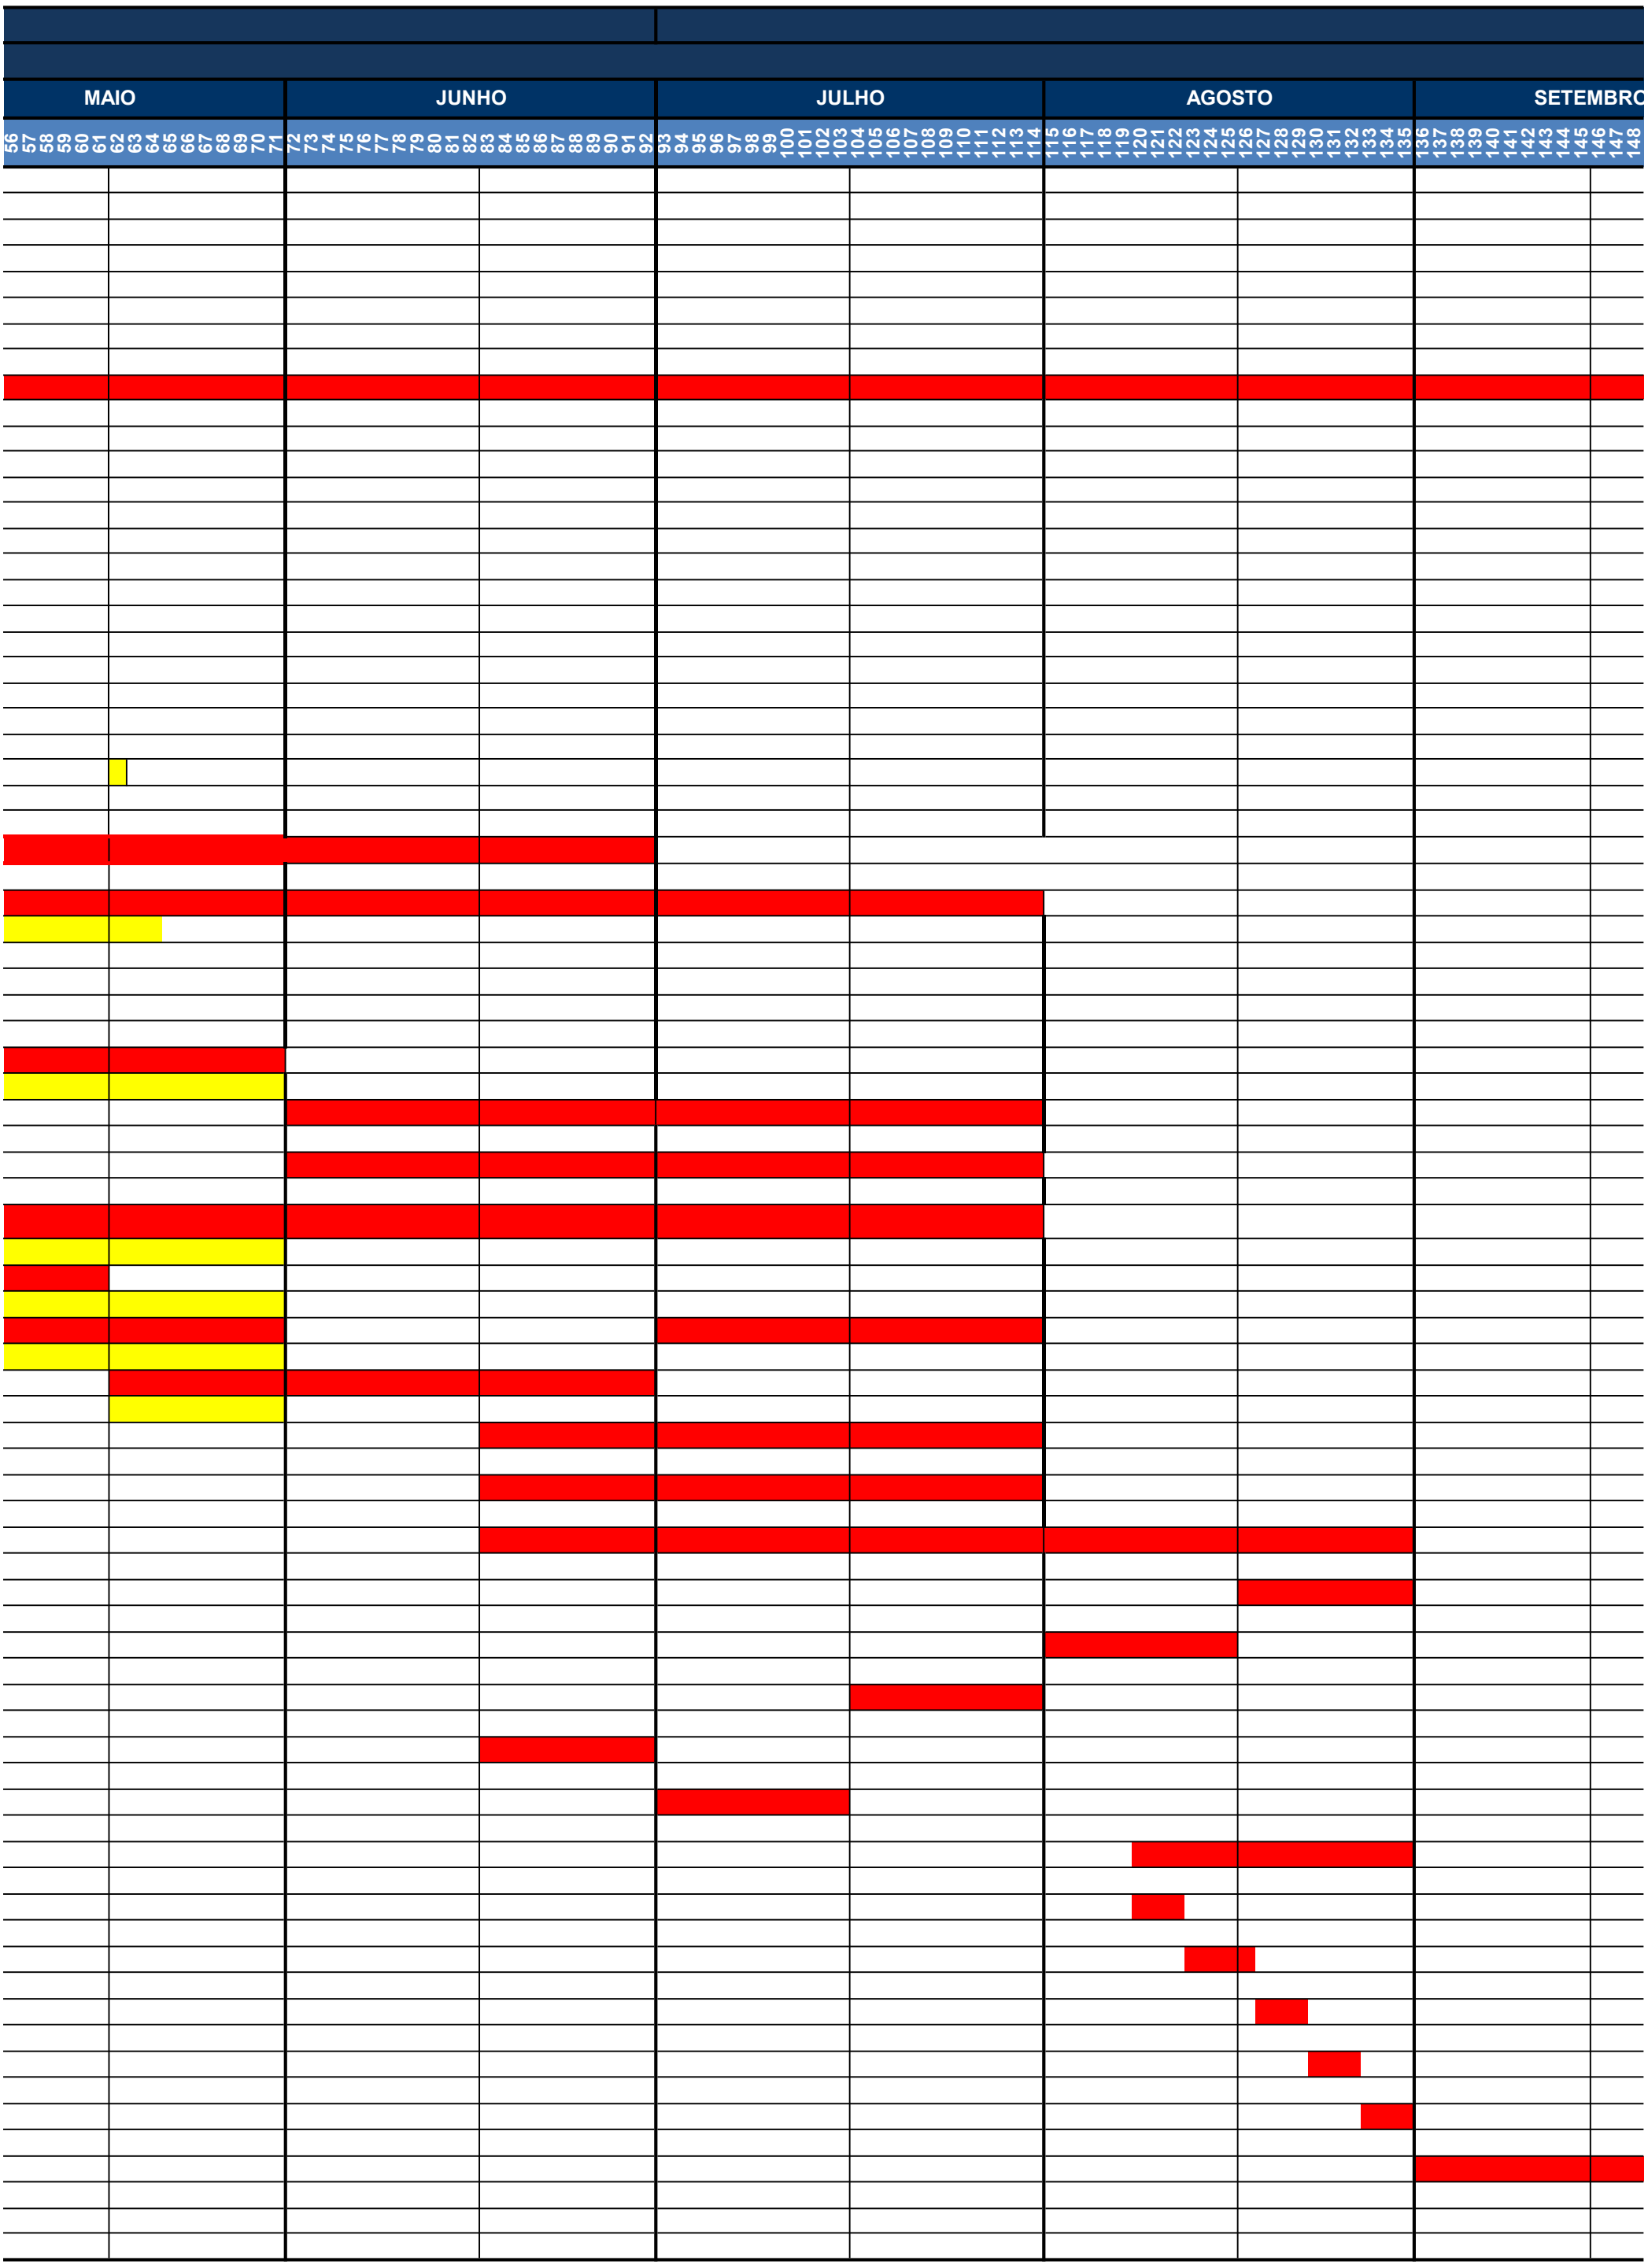
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO

	OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO	
149 150 151 152 153 154 155	156 157 158 159 160 161 162 163 164 165	166 167 168 169 170 171 172 173 174 175	176 177 178 179 180 181 182 183 184 185	186 187 188 189 190 191 192 193 194 195	196 197 198 199 200 201 202 203 204 205	206 207 208 209 210 211 212 213 214 215
